

# VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE DOMPE'

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del  
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.

DATA SOPRALLUOGO: 25-05-2017

ORA INIZIO 14:00

ORA FINE 15:30

LUOGO DI LAVORO: VIA CAMPO DI PILE – L'AQUILA

PREPOSTO: GEOM. FRANCESCO SANTUCCI

OGGETTO DEI LAVORI: AMPLIAMENTO STABILIMENTO "OMEGA PHARMA" – BLOCCO 1 - 2

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) N.9390 11-4-2017 Visibile all'ingresso	SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Cronoprogramma Costi della sicurezza Layout di cantiere Fascicolo Dell'Opera	SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
Contratto appalto/subappalto	SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra 19-7-16, 28-10-16, Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08); Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL 9-8-17 Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01);	SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
--	---

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art.109 D.Lgs.81/08); L'estintore è presente? La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci? La segnaletica è presente? Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08); Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
--	--

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08); Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08); Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art.131, comma 6 D.Lgs.81/08); Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08); Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO X NA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO X NA <input type="checkbox"/>
--	--

Certificazione corretta installazione GRU' Progetto basamento della GRU' Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg completi dei verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08); Richiesta di verifica all' A.S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi); Verifica delle scariche atmosferiche della gru; POTAIN MC85B (V.ANNUALE 26-7-16, V. TRIMESTRALE 31-03-16, POSA IN OPERA 22-12-16) POTAIN MC58B (V.ANNUALE 27-01-2017, V.TRIMESTRALE 29-03-2017, POSA IN OPERA 09-01-2017) BENEDINI B44 CITY (V.ANNUALE 9-9-16, V. TRIMESTRALE 4-5-17, POSA IN OPERA 21-7-16)	SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO X NA <input type="checkbox"/>
---	--

## FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

Montaggio scala blocco 1 Pulizia cantiere interno tunnel Carpenteria su solaio e pilastri.
--

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
--------------------------------------	--

PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
---	--

OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
--	--

PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc...	SI X NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
--	--



A seguito del sopralluogo e del controllo delle lavorazioni in atto si evidenziano delle inadempienze che andranno subito messe in sicurezza ed in particolare:

Installare idoneo parapetto e installare linea vita a ridosso delle zone ancora non protette ma in lavorazione.

Installare messa a terra su sega elettrica

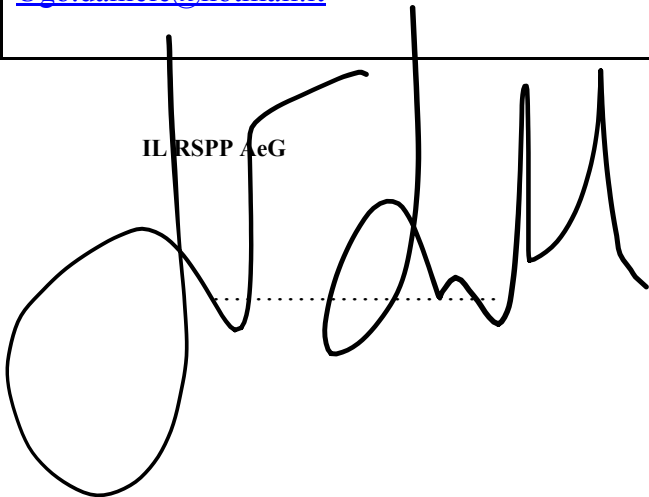
Il sopralluogo è stato effettuato con il Rspp della ditta subappaltatrice a&g che si impegnerà per la messa in sicurezza istantanea delle inadempienze riscontrate.

La zona superiore al blocco b1 risulta non in lavorazione in ogni caso prima dell'accesso al piano copertura installare linea vita e moschettoni per ancoraggio.

[amministrazione@aeggruppo.com](mailto:amministrazione@aeggruppo.com)

[Ugo.daniele@hotmail.it](mailto:Ugo.daniele@hotmail.it)

IL RSPP A&G

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke on the left side.

PROFESSIONAL SERVICE SRL

A handwritten signature in black ink, featuring a complex, overlapping structure with a horizontal line at the base.
