

Sassa Scalo li, 02/08/2018
Prot. n. 845/chs

Spett.le
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma
“Vigilanza speciale cratere aquilano 2017”
Coordinata dall’IIL Roma
Viale Maria Brighenti n. 23
00159 Roma
PEC: itl.roma@pec.ispettorato.gov.it

C.A. Ispettore Dott. Alfredo Ripanucci
e-mail: alfredo.ripanucci@ispettorato.gov.it

OGGETTO: Sisma 06/04/2009 – Lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio condominiale sito in L’Aquila – Via Campo di Fossa n. 6/B denominato Condominio del Beato. Rif. Verbale di ispezione Cod. Isp. 344 del 27/07/2018.

In riferimento al verbale in oggetto si comunica di aver adempiuto alle prescrizioni impartite, nei termini concessi.

Si trasmette idonea documentazione fotografica attestante l’avvenuto adempimento e aggiornamento al POS (Rev. 02 del 27/07/2018) con l’inserimento della specifica procedura che verrà adottata al fine di garantire in sicurezza le lavorazioni di realizzazione sbancamento e realizzazione pali.

Per quanto sopra, si chiede di essere ammessi al pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta.

Cordiali saluti

Allegati:

1. Documentazione fotografica
2. Aggiornamento POS - Rev. 02 del 27/07/2018

EDILFRAIR
COSTRUZIONI GENERALI SPA
IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Domenico ...)

Trasmessa a mezzo PEC

OGGETTO: Cantiere Edilfrair – Condominio Del Beato - verbale del 27.7.18, trasmissione foto degli adempimenti richiesti ed effettuati alla data del 01 agosto 2018.



EDILFRAIR Costruzioni Generali S.p.a.

Via S.S.17 n.42 Sassa Scalo – 67100 L'Aquila (AQ)



Aggiornamento PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

quale piano Complementare e di Dettaglio
redatto ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g, del D.Lgs.81/2008

Committente:

CONDOMINIO "DEL BEATO"
Via Campo Di Fossa 6/B - 67100 L'Aquila (AQ)
Nella persona del Sig. Luca Colarossi - Via Campo Di Fossa 6/B - 67100 L'Aquila

Impresa Appaltatrice:

EDILFRAIR Costruzioni Generali S.p.a.
Via S.S. 17 n.42 – Sassa Scalo – 67100 L'Aquila (AQ)

Indirizzo del Cantiere:

Via Campo Di Fossa 6/B - 67100 L'Aquila (AQ)

Oggetto dei lavori:

Lavori di ricostruzione di edificio crollato a seguito del sisma del 6-4-2009
Esito E – EDIFICIO INAGIBILE

| Data | Revisione | Datore di Lavoro Geom. Giovanni Frattale | R.S.P.P. Ing. Ardingo Maurizio |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 27 LUGLIO 2018 | Rev. 02 | EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. IL LEGGERE APPRESENTA (Geom. Giovanni Frattale) | RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Ing. Maurizio Ardingo |



EDILFRAIR
COSTRUZIONI GENERALI SPA

PROCEDURA OPERATIVA

PO 02
Realizzazione CONDOMINIO "DEL
BEATO

27 Lug. 2018

Pagina 2 di 5

1. SCOPO

2. APPLICABILITA'

3. ATTIVITA'



EDILFRAIR
COSTRUZIONI GENERALI SPA

PROCEDURA OPERATIVA

PO 02
Realizzazione CONDOMINIO "DEL
BEATO

27 Lug. 2018

Pagina 3 di 5

1. SCOPO


Lo scopo della presente procedura è quello di garantire in sicurezza tutte le lavorazioni di realizzazione allo sbancamento, della realizzazione dei Pali e relativa attività di getto del calcestruzzo degli stessi. Infatti, la presente si rende necessaria in quanto, nella zona adiacente allo sbancamento, è presente l'attività di perforazione dei pali di sostegno della platea, tale lavorazione avviene a tre metri al di sotto dello sbancamento, come da foto 1.

2. APPLICABILITA'


La presente procedura è stata redatta a garanzia della sicurezza dei seguenti soggetti presenti:

1. Personale Edilfrair;
2. Personale sub appaltatori;
3. Tecnici di cantiere;

Foto 1 – zona interessata alla messa in sicurezza

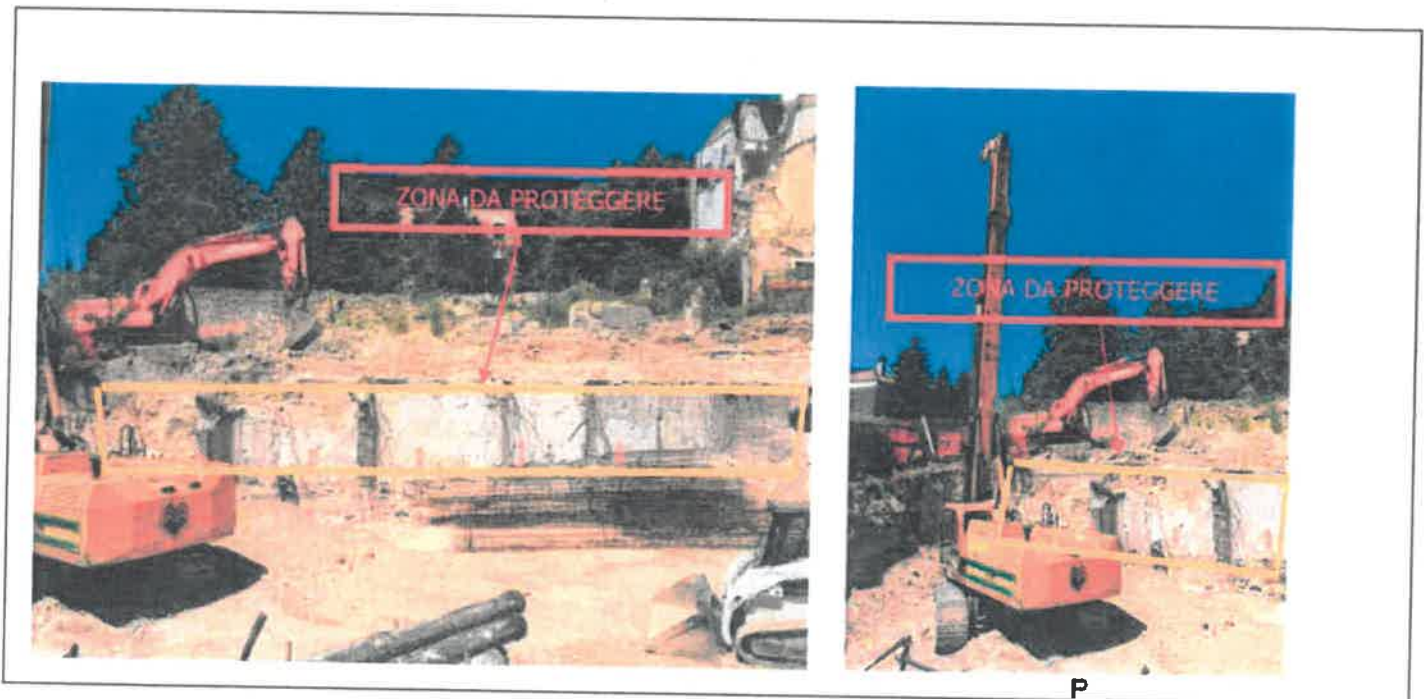

Al fine di garantire la massima sicurezza nella zona interessata, i lavori saranno effettuati non in concomitanza e/o a una distanza dal fronte del muro di almeno 5 m.



3. ATTIVITA'

Realizzazione dello sbancamento e realizzazione dei Pali di fondazione.

Il personale di cantiere prima di svolgere qualsiasi attività inerente la realizzazione dello sbancamento e la realizzazione dei Pali di fondazione dovrà attenersi a tali prescrizioni:

- ❖ *Munirsi di radio ricetrasmittenti, al fine di poter comunicare a distanza con gli operatori dei mezzi meccanici, garantendo una sicura trasmissione dei dati/informazioni tra tutte le maestranze in cantiere.*
- ❖ *Durante le lavorazioni dello sbancamento, visto che il fronte ha un dislivello di circa 3,00 m di altezza, rispetto alla lavorazione delle perforazioni, non potranno essere eseguite in concomitanza.*
- ❖ *Qualsiasi lavorazione all'interno dell'area di cantiere, durante l'attività di sbancamento, dovrà svolgersi ad una distanza di almeno 5 metri dal muro in evidenza.*
- ❖ *Tale distanza dovrà essere delimitata con segnalazione ben evidente comprensiva di cartellonistica.*
- ❖ *Ovunque c'è una macchina operatrice in funzione, tale area deve essere ben delimitata e segnalata in base al suo raggio di azione*

Le attività in questione verranno realizzate e sorvegliate costantemente da un preposto addetto.

Attività di getto dei Pali di fondazione.

L'autobetoniera con pompa dovranno posizionarsi nell'apposito spazio indicato in planimetria, al fine di non arrecare interferenze alle attività di viabilità.

L'area dovrà essere sempre libera da ingombri

Durante le operazioni di getto in concomitanza di altre lavorazioni, verrà utilizzato un apposito moviere/personale al fine di ridurre eventuali rischi di interferenza.

Ripristino della viabilità di cantiere e completamento dell'area logistica.

Tutte le attività di scavo e perforazioni dovranno proseguire in funzione,

- La viabilità di cantiere deve rispettare i percorsi pedonali da quelli carrabili per i mezzi pesanti.
- Ripristinare la viabilità in modo che, i pedoni abbiano una sicurezza adeguata, con una buona visibilità e una adeguata delimitazione.
- Eseguire una scala/andatoia di larghezza non inferiore a 70 cm, dall'area logistica al piano cantiere, con la segnaletica ben visibile.

Le attività in questione verranno realizzate e sorvegliate costantemente da un preposto addetto

Per le attività in questione attenersi sempre agli interventi, disposizioni e procedure già valutate nel documento POS.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
|  EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PROCEDURA OPERATIVA | 27 Lug. 2018 |
| | PO 02 Realizzazione CONDOMINIO "DEL BEATO | Pagina 5 di 5 |

IL PREPOSTO IMPRESA EDILFRAIR

[Handwritten signature]

IL PREPOSTO IMPRESA PERFORAZIONI

[Handwritten signature]

IL PREPOSTO IMPRESA FED LAVORI

[Handwritten signature]

Da: Posta Certificata Legalmail
A: edilfrair@legalmail.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: Condominio del Beato - L'Aquila - rif. verbale di ispezione cod. isp. 344 del 27/07/2018 - comunicazione adempimento
Data: giovedì 2 agosto 2018 10:56:42
Allegati: [dati-cert.xml](#)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 02/08/2018 alle ore 10:56:42 (+0200) il messaggio "Condominio del Beato - L'Aquila - rif. verbale di ispezione cod. isp. 344 del 27/07/2018 - comunicazione adempimento" proveniente da "edilfrair@legalmail.it" ed indirizzato a:
itl.roma@pec.ispettorato.gov.it ("posta certificata")
alfredo.ripanucci@ispettorato.gov.it ("posta ordinaria")
maurizio@ardingo.it ("posta ordinaria")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 78BCD653.030FA74A.F9DA79D3.2C26AB50.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 02/08/2018 at 10:56:42 (+0200) the message, "Condominio del Beato - L'Aquila - rif. verbale di ispezione cod. isp. 344 del 27/07/2018 - comunicazione adempimento", sent by "edilfrair@legalmail.it" and addressed to:
itl.roma@pec.ispettorato.gov.it ("posta certificata")
alfredo.ripanucci@ispettorato.gov.it ("posta ordinaria")
maurizio@ardingo.it ("posta ordinaria")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 78BCD653.030FA74A.F9DA79D3.2C26AB50.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.
